


Planerne for Musikkens Hus i Nordjylland ligger fast

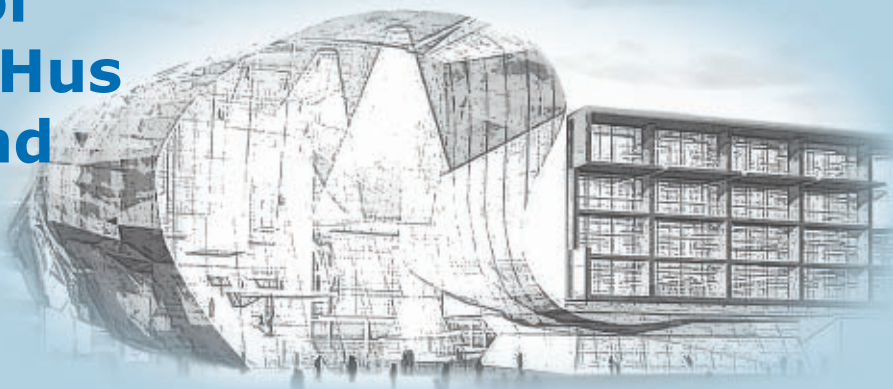

På baggrund af de verserende historier i medierne vedrørende Musikkens Hus i Nordjylland vil de to bygherrer for projektet (Fonden Musikkens Hus i Nordjylland og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger) udtale følgende:

Det er korrekt, at arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)au's arbejde med at udarbejde dispositionsforslag for projektet ikke er færdiggjort inden for den aftalte tidsramme - 31. oktober 2003. Derfor har bygherrerne for Musikkens Hus besluttet, at give firmaet en frist til færdiggørelse af dispositionsforslaget inden for de første 2 måneder af det nye år.

Det er også korrekt, at der fra arkitektfirmaet har været flere beløbsrammer i spil, hvilket ikke er et ukendt fænomen når der er tale om så omfangsrige projekter som det nærværende. Bygherrerne for Musikkens Hus vil understrege, at man står fast på den beløbsramme på 460 mio. kr., der hele tiden har fremgået for projektet.

Der foregår stadige forhandlinger med arkitektfirmaet for at få tilpasset projektet indenfor den aftalte beløbsramme på 460 mio. kr. Bygherrerne for Musikkens Hus har overfor arkitektfirmaet præciseret rammerne i konkurrenceprogrammet, således at der indenfor beløbsrammen kan nås den bedst mulige løsning i forhold til indretning og form.

Projektledelsen vil snarest drøfte muligheden for at indhente forsinkelsen med rådgiveren (Coop Himmelb(l)au), idet bygherrerne også fastholder, at Musikkens Hus skal være færdig indenfor den forudsatte tidsramme.

Yderligere oplysninger kan hentes ved Formanden for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, rektor Sven Caspersen

Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
